



Nordre Follo
kommune



Statusrapport Magasinparken Ungdomsskole

Magasinveien 31
Dato: 20.06.2023




Statusrapport for Magasinparken ungdomsskole

Prosjektet er nå ferdig med pelearbeider, og energibrønnene er ferdig borret. Det vil si at de sterkt støyende arbeidene er ferdigstilt. Anleggsgjerde mot Magasinparken er oppgradert for å ivareta sikkerhet til naboer og forbipasserende.

Planlagte kommende arbeider

- Betongarbeider med støpning av fundamenter og bunnplate.
- Legging av tekniske føringer i grunnen.
- Påkobling til eksisterende VA-anlegg som ligger i gangveien øst for byggeplassen.
- Byggeplassen vil ta ferie i uke 29 og 30. Det antas at det ikke vil være produksjon i denne perioden.
- I september vil vi bæresystemet i massivtre bli levert. Montering er planlagt frem til starten av februar
- To tårnkraner vil bli montert i uke 36, iht skissen under.

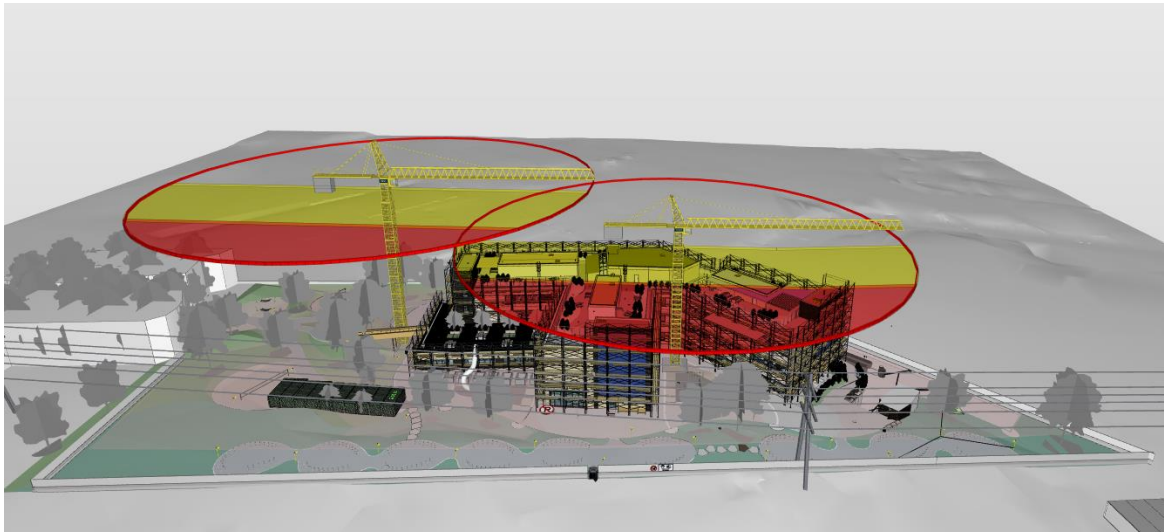

Tidspunkt for drift og støy

Vanlig drift på byggeplassen skjer normalt mellom kl 07:00 – 19:00 på hverdager. Montering av bæresystemet vil foregå i 2 skift, som vil si at det vil være produksjon fra kl 07:00 - ca 22:00. Montering av bæresystemet er planlagt fram til starten av februar.

Støyende arbeider

Sterkt støyende arbeider er ferdigstilt. Prosjektet har dokumentert støy, setninger, og vibrasjoner, og kan tilbakemelde at målingene ikke har hatt avvik.

Høyspent

Se status for nedgravingen av høyspent på kommunens nettside i linken under. Nedgravingen er ikke en del av skoleprosjektet.

<https://www.nordrefollo.kommune.no/nyheter/2023/mai/status-for-nedgraving-av-hoyspentledning-gjennom-finstad---ski-vest/>

Har du spørsmål

Har du spørsmål eller innspill vedrørende arbeider på byggeplassen ta kontakt med byggeplassadministrasjonen. Vårt mål er å gjennomføre prosjektet på best mulig måte for alle.

Hovedbyggeleder fra Nordre Follo Kommune

Tomas Waag Helmeriksen

tomas.helmeriksen@advansia.no,

TLF: 91 72 42 18

Anleggsleder fra Entreprenør Hent AS

Helge Fristad

helge.fristad@hent.no

TLF : 91 78 01 71

Med vennlig hilsen

Rebecca Celine Høynes

Prosjektleder Nordre Follo kommune

rebecca.hoynes@nordrefollo.kommune.no

TLF: 47 62 90 63
